




H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO LA MISA, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
 LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-17-FISMDF-SC-01
 MONTO CONTRATO: \$281,838.99 (SIN IVA)
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.
 FECHA DE INICIO: 10 DE ABRIL DEL 2017
 FECHA DE TERMINACION: 28 DE ABRIL DEL 2017
 LUGAR Y FECHA: EJIDO LA MISA, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA., A: 29 DE ABRIL DEL 2017, SIENDO LAS 08:00 HRS

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V., declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato

AMBAS PARTES manifiestan que no existen otros adeudos y, por lo tanto, se darán por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION ÚNICA		IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	
1	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	429.04	5.91	2,535.63	429.04	2,535.63	2,535.63
2	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. P.U.O.T.	M3	330.36	44.33	14,644.86	330.36	14,644.86	14,644.86
3	PLANTILLA APISONADA CON ARENA, COMPACTADA CON PISON DE MANO, EN ZANJAS. INCLUYE: ACARREO HASTA LA OBRA, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y COLOCACION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA LA TUBERIA, HUMECTACION, COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	30.03	213.49	6,411.10	30.03	6,411.10	6,411.10
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41, SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	429.04	117.46	50,395.04	429.04	50,395.04	50,395.04
5	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	116.65	213.49	24,903.61	116.65	24,903.61	24,903.61
6	RELLENO A VOLTEO CON EQUIPO DE ZANJAS CON MATERIAL "A" Y/O "B". INCLUYENDO SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	180.19	43.41	7,822.05	180.19	7,822.05	7,822.05
7	SONDEO A MANO EN MATERIAL B HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE.	PZA	16.00	534.31	8,548.96	8.00	4,274.48	4,274.48
8	TOMA DOMICILIARIA CON TUBO DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION. INCLUYE: INCLUYE CUADRO DE MEDICION A BASE DE TUBO CPVC DE 1/2", CODOS, CONECTORES, VALVULA DE CONTROL, LLAVE DE JARDIN, TRAZO, PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. LONG.. HASTA 12 MTS. (NO INCLUYE EXCAVACION) P.U.O.T.	LOTE	73.00	1,719.16	125,498.68	73.00	125,498.68	125,498.68

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO LA MISA, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
 LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-17-FISMDF-SC-01
 MONTO CONTRATO: \$281,838.99 (SIN IVA)
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.
 FECHA DE INICIO: 10 DE ABRIL DEL 2017
 FECHA DE TERMINACION: 28 DE ABRIL DEL 2017
 AMBAS PARTES manifiestan que no existen otros adeudos y, por lo tanto, se darán por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación

LUGAR Y FECHA: EJIDO LA MISA, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA., A: 29 DE ABRIL DEL 2017, SIENDO LAS 08:00 HRS
 CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V., declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION ÚNICA		IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE 102 MM (4") DE DIAMETRO BRIDADA INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	2.00	3,803.84	7,607.68	1.00	3,803.84	3,803.84
10	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 5 CM. DE ESPESOR, CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2, T.M.A.= 3/4" DE DIAMETRO, EN PISOS Y LOSAS, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, ACERO DE REFUERZO DE F'y= 4200 KG/CM2 Y CIMBRA DE MADERA. CAJA TIPO 2 DE 1.30 X 1.20 M.	CAJA	1.00	5,383.33	5,383.33	1.00	5,383.33	5,383.33
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 MTS. CON CANAL DE 102 MM (4").	PZA	1.00	3,713.02	3,713.02	1.00	3,713.02	3,713.02
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE Fo.Fo. TIPO MEDIANO DE 50 X 50 CMS.	PZA	2.00	2,953.66	5,907.32	1.00	2,953.66	2,953.66
13	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 19 X 82 MM (5/8" X 3").	PZA	16.00	18.44	295.04	20.00	368.80	368.80
14	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 100 MM (4") DE DIAMETRO.	PZA	4.00	44.51	178.04	2.00	89.02	89.02
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE Fo.Fo. DE 4"X4" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2,723.00	2,723.00	0.00	0.00	0.00
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE. DE Fo.Fo. DE 4"X4" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2,506.82	2,506.82	1.00	2,506.82	2,506.82
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA MECANICA DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO	PZA	4.00	794.49	2,937.96	3.00	2,203.47	2,203.47
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE PVC HID. DE 4"X4" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	559.78	1,119.56	2.00	1,119.56	1,119.56




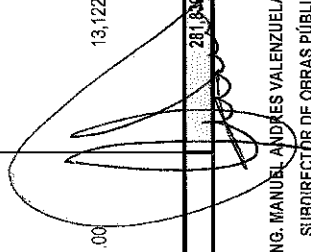


H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO LA MISA, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
CONTRATO No.: GUAYMAS-17-FISMDF-SC-01
MONTO CONTRATO: \$281,838.99 (SIN IVA)
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.
FECHA DE INICIO: 10 DE ABRIL DEL 2017
FECHA DE TERMINACION: 28 DE ABRIL DEL 2017
AMBAS PARTES manifiestan que no existen otros adeudos y, por lo tanto, se darán por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación

LUGAR Y FECHA: EJIDO LA MISA, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA., A: 29 DE ABRIL DEL 2017, SIENDO LAS 08:00 HRS
CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V., declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato

CONCENTRADO DE VOLUMENES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION ÚNICA		IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC HIDRAULICO. DE 4"X90° INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	488.04	976.08	1.00	488.04	488.04
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC HIDRAULICO. DE 4"X4" INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	572.37	1,717.11	2.00	1,144.74	1,144.74
21	ATRAQUE DE CONCRETO TRAPESOIDAL DE 10x45x30 DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	6.00	438.01	2,628.06	9.00	3,942.09	3,942.09
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PVC HID. DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	564.34	3,386.04	8.00	4,514.72	4,514.72
FP01	RASPADO DE CALLES INCLUYE: EQUIPO MOTOCONFORMADORA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	LOTE	0.00	13,122.44	0.00	1.00	13,122.44	13,122.44
TOTAL							281,838.99	281,838.99
C. ING. LUIS ALBERTO VILLEGAS SALGADO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.		 SUPERVISOR		C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		
